

Status SNR

Møte med Nipr, 09.11.23

Ketil Gaupset
Prosjektsjef SNR

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal



Vidareutvikle prehospitaler tenester



Hovudinngang | Dagbehandling |
Forskning- og undervisningsareal |
Auditorium | Kantine

Sengepostar | Laboratorium |
Intensiv | Bildediagnostikk

Psykatri- og habiliteringsbygg

Sengepostar | Poliklinikker

Akuttmottak | Operasjon |
Sterilsentral

Energisentral

Kortidspost | Sentralkjøkken

Hjelset 31.10.23



Sengepostar | Laboratorium |
Intensiv | Bildediagnostikk

Sengepostar | Poliklinikker

Hovudinngang | Dagbehandling |
Forskning- og undervisningsareal
| Auditorium | Kantine

Akuttmottak | Operasjon | Sterilsentral

Psykiatri- og habiliteringsbygg

Om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

- SNR vil erstatte de to sykehusene i Kristiansund og Molde og skal gi pasienttilbud til rundt 120 000 innbyggere
- Full drift våren 2025
- Rundt 2000 ansatte vil jobbe ved SNR
- SNR Hjelset blir ca. 60 000 m²
- SNR Kristiansund er foreløpig planlagt til ca. 8000 m²



Pasienttilbud



- Indremedisin med alle åtte grenspesialiteter
- Kirurgi innan gastrokirurgi, urologi og plastikk
- Ortopedi
- Gynekologi
- Barn og unge
- Føde og barsel
- Kreftbehandling
- Prehospitale tjenester
- Psykisk helsevern
- Rus- og avhengighetsbehandling
- Øre, nase og hals

- Tann- og kjevekirurgi
- Øye
- Nevrologi
- Bildediagnostikk
- Laboratorium
- Hud
- Rehabilitering
- Habilitering for barn og vaksne
- Lærings- og mestringscenter
- Forsking, utdanning og undervisning

SNR Hjelset


- Prosjektet er i rute og følger oppsatt produksjonsplan
- Økonomi: Sluttestimert 6 616 MNOK (P 70-verdi, april 2023 kroner)
- Pågår fasademontasje, innvendige arbeider og teknisk montasje i teknisk sentral og somatikkbygget
- I psykiatri- og habiliteringsbygget er det både råbyggearbeider og innvendige arbeider
- Prosjektet har startet prosessen med demobilisering av utbyggingsorganisasjonen



Flere milepæler i høst



- Tett bygg for psykiatri- og habiliteringsbygget i høst
- Bygningsmessig arbeid i følgende områder blir ferdigstilt: korttidsposten, akuttmottaket og varemottaket
- Er i toppfasen med 350 arbeidere på byggeplassen

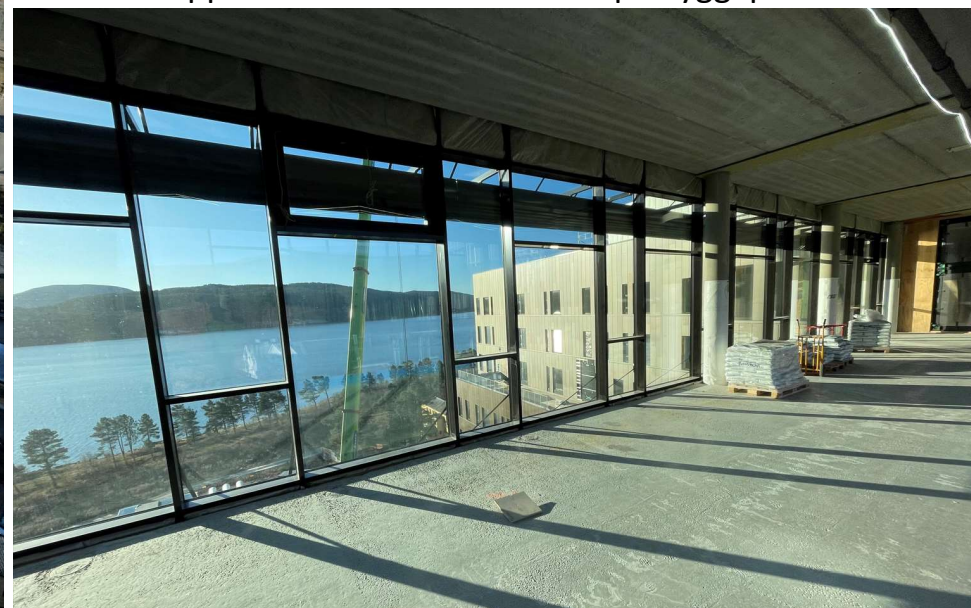

Mange befaringer på byggeplassen



Ortopediske leger ved SNR klinikken



Ansatte ved medisinskteknisk avdeling

Samordna plan - felles plan for forberedelse til drift og klinisk ibruktakelse av SNR



Molde sjukehus



Psykiatriske tilbud på Hjelset



Kristiansund sjukehus



SNR 2025




• Hensikt

- Sikre «trygg og god» ibruktakelse for pasienter og ansatte
- Begrense perioden med redusert drift før og etter ibruktakelse

• Sentrale momenter i planen

- Definere rekkefølge innflytting av funksjoner
- Testing av bygg og tekniske installasjoner
- Opplæring av ansatte i HMR
- Kliniske driftssimuleringer
- Mottak av utstyr
- Flytteprosjekt

Innflytting SNR

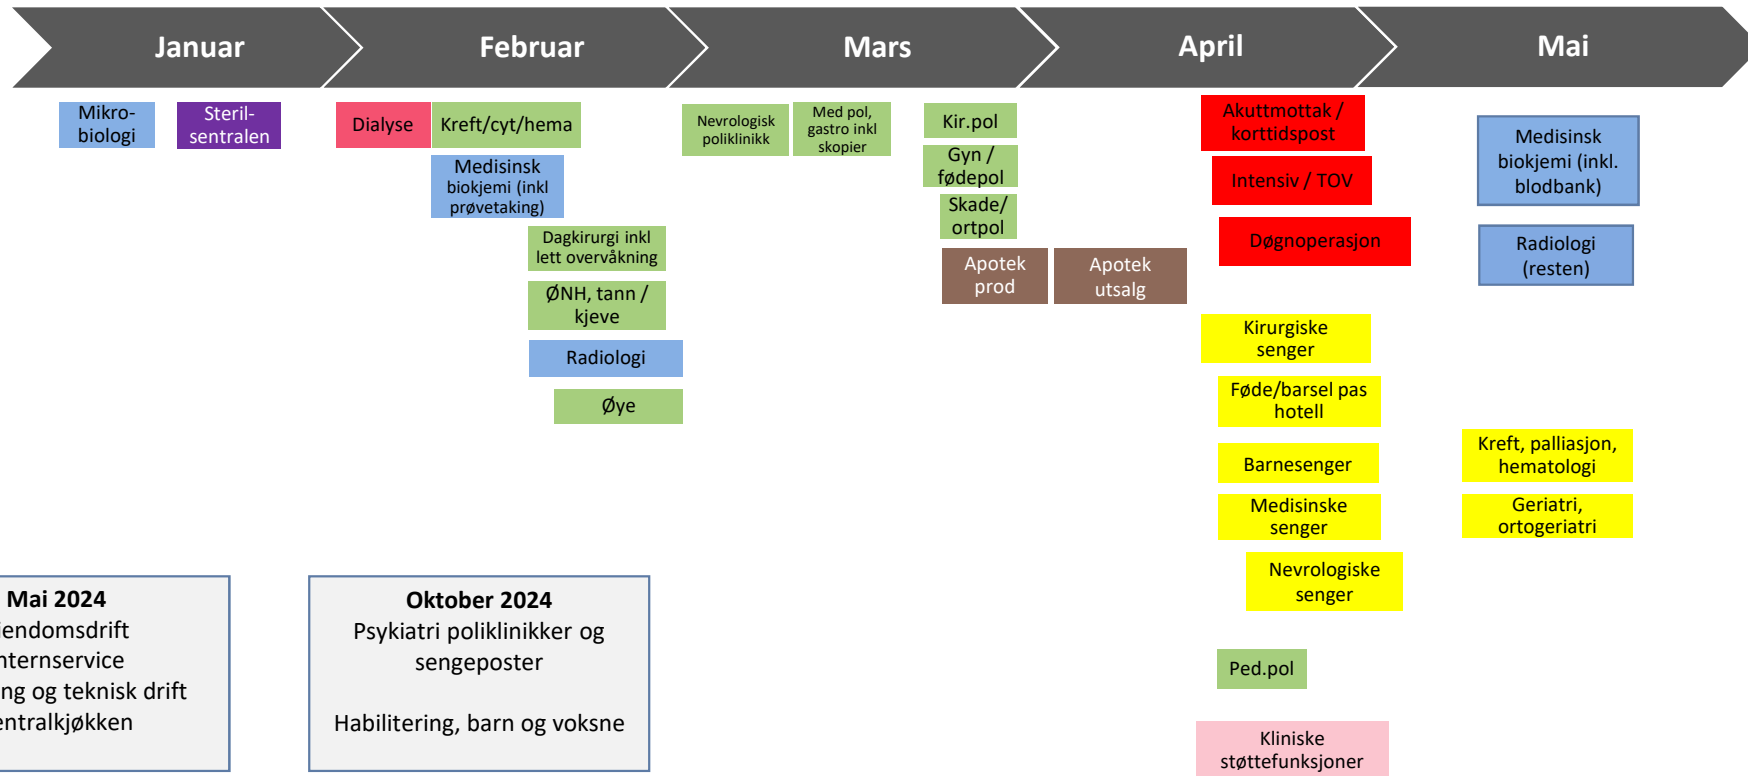

Øvrige fagområder (uten foreløpig dato): LMS, MTA, Fag og Forskning, Auditorium/møterom, HEMIT, Prest, Seremonirom, overnattingsareal etc.

Innflyttingsplan


Område		Uke
Eiendomsdrift SNR (midl tekn sentral)	13.mai 2024	
Internservice SNR	13.mai 2024	
Forsyning og teknisk drift	21. - 23.mai 2024	
Sentralkjøkken	21. - 23.mai 2024	
Plan 2 Habilitering	14. - 16.okt 2024	
Plan 1 Psykiatri	21. - 25.okt 2024	
U2 Psykiatri	28.okt - 1.nov 2024	
Mikrobiologen	6. - 10.jan 2025	2
Sterilsentral	13. - 17.jan 2025	3
Dialyse	1. - 3.feb 2025	5/6
Kreft cyt hema	3. - 4.feb 2025	6
Med biokjemi/ prøvetaking	3. - 6.feb 2025	6
Dagkir	10. - 12.feb 2025	7
ØNH	10. - 12.feb 2025	7
Radiologi	10. - 14.feb 2025	7
Øye	13. - 15.feb 2025	7
Nevrologisk pol	5. - 7.mars 2025	10
Med pol inkl skopier	17. - 20.mars 2025	12

Kir pol	24. - 28.mars 2025	13
Gyn/føde pol	24. - 28.mars 2025	13
Skade/ orto pol	27. - 28.mars 2025	13
Apotek produksjon	29.-30. mars 2025	13
Apotek utsalg	5.-6. april 2025	14
Klinisk støtte	22.april 2025	17
Kir seng	22.-25.april 2025	17
Akuttmottak KTO	22.-25.april 2025	17
Intensiv TOV	25.-27.april 2025	17
Operasjon	27.april - 1.mai 2025	17/18
Føde/barsel	27.april - 1.mai 2025	17/18
Ped. pol	27. april 2025	17
Barnesenger	27.april - 1.mai 2025	17/18
Med seng	27. april - 1.mai 2025	17/18
Nevrologisk seng	1. mai - 4. mai 2025	18
Med biokjemi/ blodbank (resten)		19
Radiologi (resten)		19
Kreftsenger	12. - 16.mai 2025	20
Ortogeriatri	12. - 16.mai 2025	20


Opplæring ansatte HMR



Organisering av opplæringsarbeidet

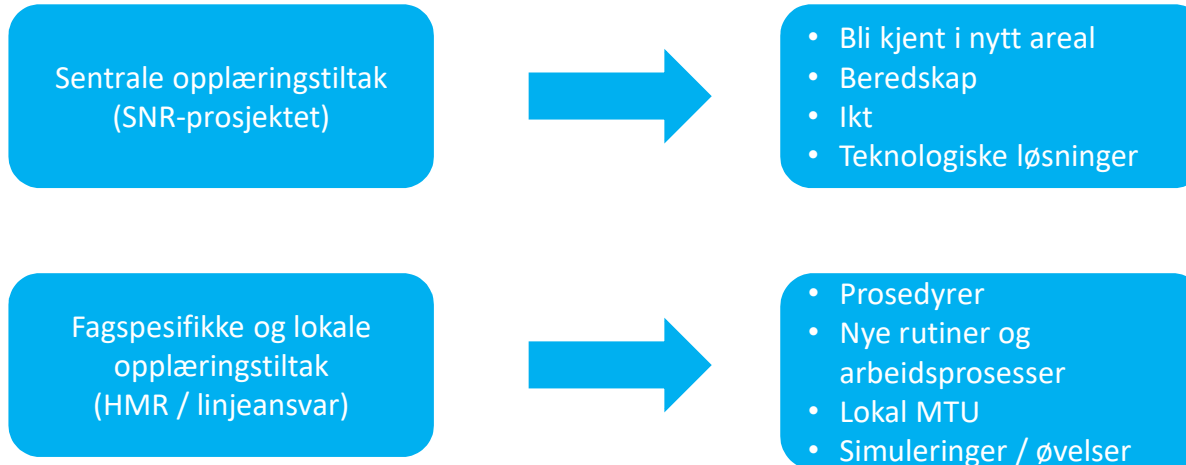

Overordna framdrift samordna plan

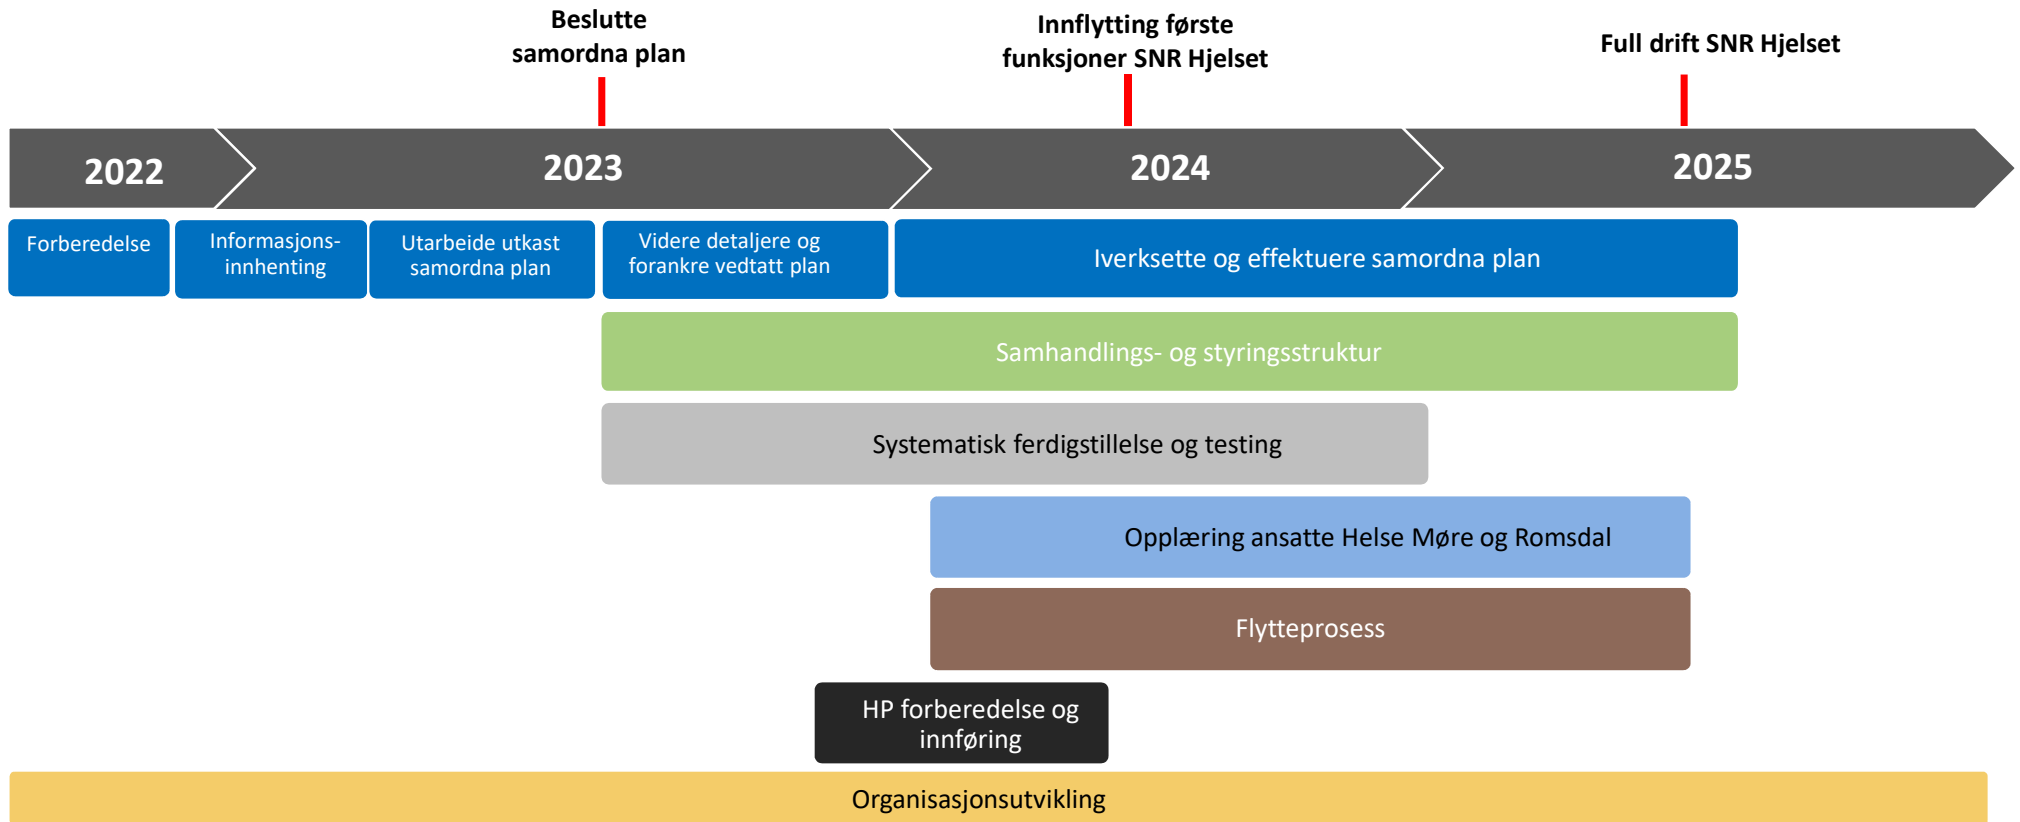

SNR Kristiansund






- Polikliniske tilbud:
 - Medisin
 - Kirurgi og ortopedi
 - Gynekologi
 - Nevrologi
 - Urologi
 - Øye - screeningtilbud
 - Øre-nese-hals
 - Hud
 - Cytostatika
 - Pediatri
- Medisinsk dagbehandling
- Dagkirurgi:
 - Ortopedi og gynekologi
- Bildediagnostikk
 - CT, MR, røntgen, ultralyd og bentetthetsmåling
- Laboratorietjenester
- Tannbehandling i narkose
- Hørselstilbud
- Dialysesatelitt
- Læring og mestring
- Screeningscenter for tykk- og endetarmskreft
- Palliative tilbud
- Pusterom
- Klinisk ernæringsfysiolog
- Logoped

Status SNR Kristiansund

- Oppstart optimalisert forprosjekt høst 2022
- Sak i styremøtet 13. juni 2023:
 - Vedtatte tilbud etableres innenfor kostnadsramme – vurdere omfang
- I mai ble det kjent at regjeringen bevilger 15. mill. kr til ortopedisk avdeling i Kristiansund
- Optimalisert forprosjekt:
 - Klinikkene i HMR har jobbet videre med å detaljere volum av tjenester
 - Legges frem for styret i HMR tidlig 2024
- Vurderer totalareal for SNR Kristiansund og Kristiansund kommune i DMS



Arealbruk og økonomi

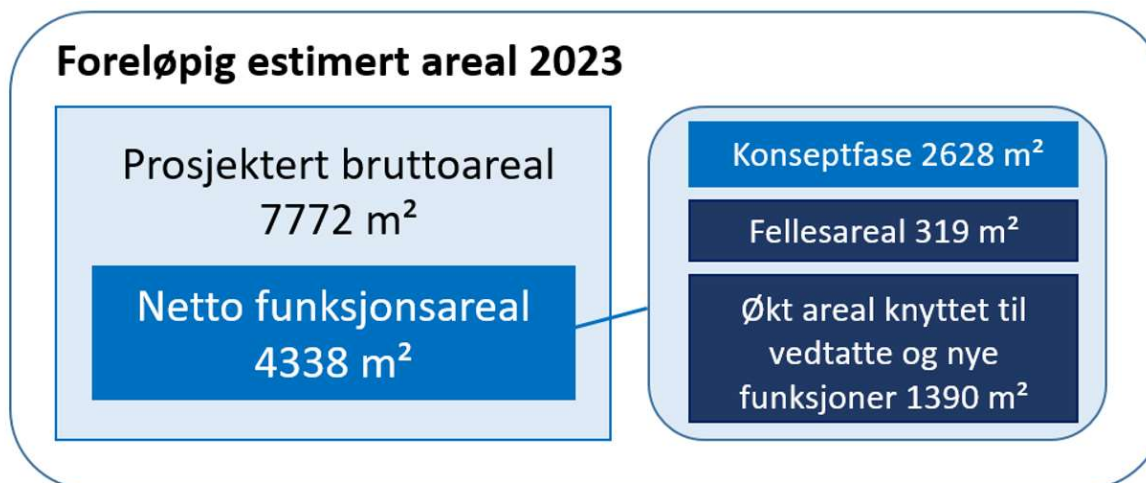

Budsjett SNR Kristiansund (april 2023-kroner)

- 126,7 MNOK (bygg)
- 22,7 MNOK (IKT)

Kalkyle somatisk areal

- Ca 200 MNOK

Psykiatriske tilbud ved SNR Kristiansund

- Økt ramme gjennom statsbudsjettet

- Det er mulig å etablere funksjonelle arealer for både barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og voksenpsykiatrisk poliklinikk i dagens sykehuskropp i plan 2 og 3

Funksjon	Programmert areal (m ²)	Prosjektert areal (m ²)
2. etasje BUP	647	1014
3. etasje voksenpsykiatrisk poliklinikk	923	1616
U1, felles (garderober)	64	63
Totalt areal	1634	2693

Kalkyle areal psykiatriske tilbud

- Psykiatrisk poliklinikk for barn og unge har en kalkyle på 35 MNOK
- Voksenpsykiatrisk poliklinikk har en kalkyle på 55 MNOK

Forslag statsbudsjett 2024

Prop. 1 S (2023–2024)

- **2.12 Samhandlingstiltak i Kristiansund**
- Det foreslås 25 mill. kroner til Helse Midt-Norge RHF som skal gå til Helse Møre og Romsdal HF og tiltak i Kristiansund. Midlene er varige og skal gå til å styrke det distriktsmedisinske senteret som skal erstatte Kristiansund sjukehus når nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig på Hjelset i 2025. Tilskuddet vil legge til rette for nødvendige investeringer for å samle poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern ved DMS Kristiansund. Dette vil også legge til rette for bedre samhandling med kommunene og gi et styrket pasienttilbud.

Følg oss på nett og i SoMe



Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF bygger eit nytt fellessjukehus for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal. Her kan du følgje aktivitetane i prosjektet.

Nye SNR →



Aktivitetar i prosjektet

Her kan du følgje med på kva som skjer i prosjektet

Sjå kva som skjer →

Sjukehuset Nordmøre...

Guri Viken
Administrator · 26. okt. · 🌐

Vi er i en toppfase i prosjektet med høy aktivitet og rundt 350 arbeidere i sving på byggeplassen. Her kan du møte noen av dem 😊



Se innsikt

Innleggets rekkevidde: 1,6 k

nye_snr_hmr ▾



214
Innlegg

1 325
Følgere

111
Følger

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse/skjønnhet

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal stå klart våren 2025. Se ledige stillinger i HMR her: <https://tinyurl.com/yckvxn3f>

Se oversettelse

helse-mr.no

Profesjonelt dashboard

1,4 k kontoer er nådd de siste 30 dagene.

Rediger profil

Del profil



Frå byggeto...



Råbygget



Pasienttilbud



Julekalender



Nytt

